
# 国分寺市バリアフリー特定事業の進捗状況 (令和5年度実績)

令和7年1月 **国分寺市** 

## 目 次

1.	国分	寺駅周辺地区の重点整備地区の区域図	· 1
1	-1.	国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域, 生活関連施設,	
		生活関連経路図 ······	· 1
2.	特定	事業計画	. 3
		公共交通特定事業····································	
		道路特定事業	
		都市公園特定事業	
		建築物特定事業 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		交通安全特定事業	
2	2-6.	教育啓発特定事業	61
2	2-7.	その他の事業	69

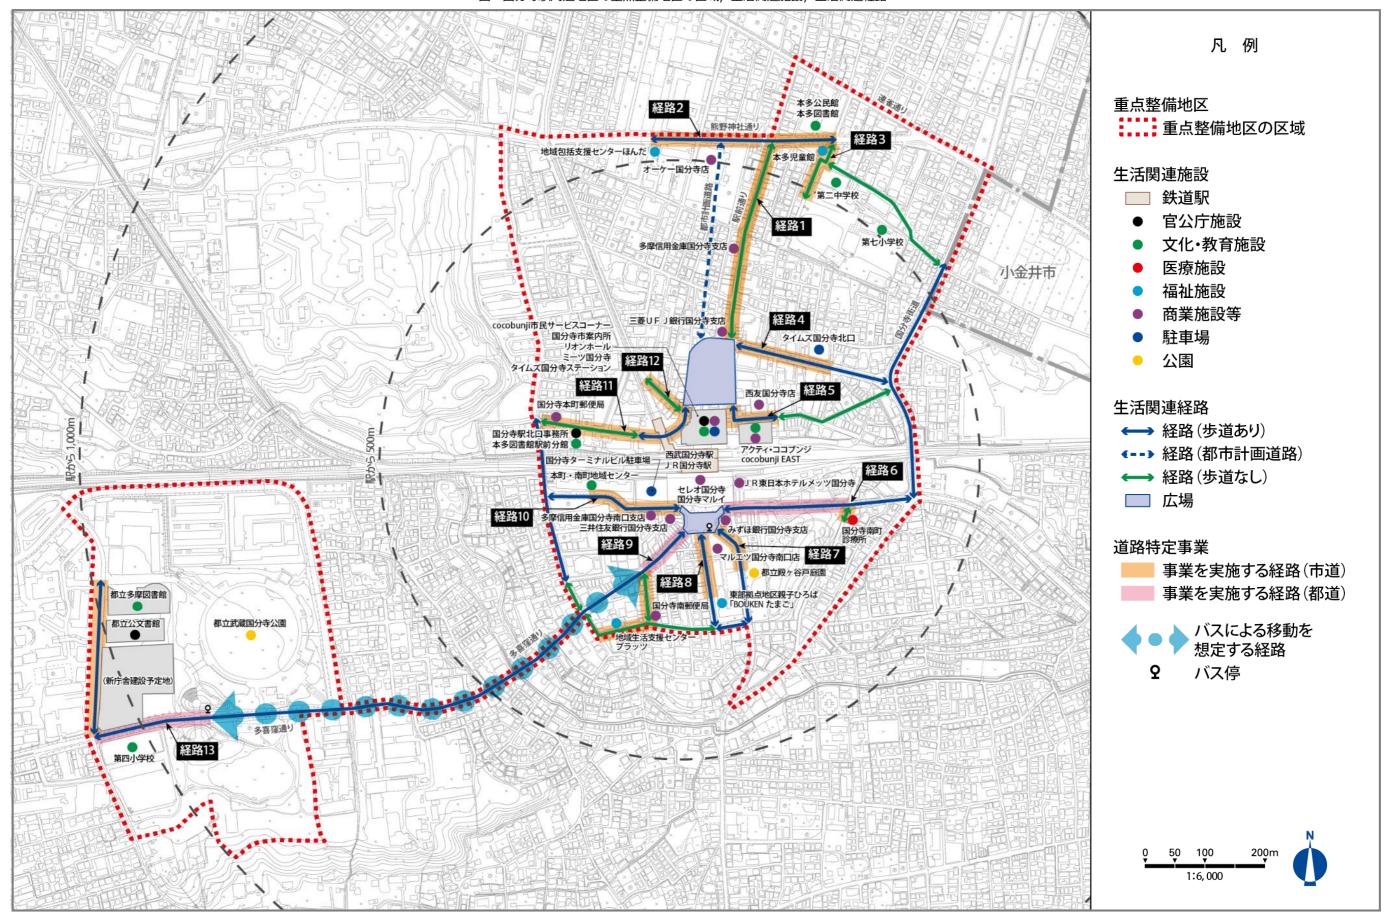

### 公共交通特定事業

整備対象
J

JR 国分寺駅

### 対象事業者名 JR 東日本

### 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田勺	尹未广)日	箇所数	時期				短期					長期		
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	有人改札口に車いす使用者 に対応したカウンターを設	1か所	継続	実施時期				<del>,</del>	※検	討中	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
	置	1 /3 / //	検討	備考 進捗状況	大規模	改修に	併せ改	修を検	討					
	  有人改札口における筆談ツ			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	ールの準備とその表示の設	1 1か所	短期	大心时知										
_	置	173771	711743	備考 進捗状況	実施済									
				r514-04-00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
	ホーム階段下への侵入防止		継続	実施時期										
3	のための柵等の設置	3か所	検討	備考 進捗状況	1 か所		ホーム	) は侵	入防止		整備を 防止設			-
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	  ホームドアの設置	2ホー	長期	<b>夫</b> 厄吋期										
7	M AT ) ONE	ム4列	16/01	備考 進捗状況	2031 1	年度ま	での整	備に向(	ナ検討の	†				
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ر ص				大心时知										
他				備考										
I				進捗状況										

### 実施に必要な資金額及び調達方法

・自己資金及び鉄道駅バリアフリー料金制度により調達予定

### 実施済項目

- ・各ホームエレベーター整備済
- ・駅ホーム内方線整備済

### その他事項



### 公共交通特定事業

整備対象 西武国分寺駅

対象事業者名 西武鉄道株式会社


### 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
ш,	72.71	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	有人改札口の筆談対応の表	1 力所	短期	<b>夫</b> 爬吋期										
1	示の改善	1,75/71	711743	備考 進捗状況	R5 実紡	<b></b> 色済								
-				~=1> D()/U						1		1		1
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				<i>∞,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
-				備考										
				進捗状況										
				中作吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
7				\$#F####	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考 進捗状況										

### 実施に必要な資金額及び調達方法

### 実施済項目

### その他事項

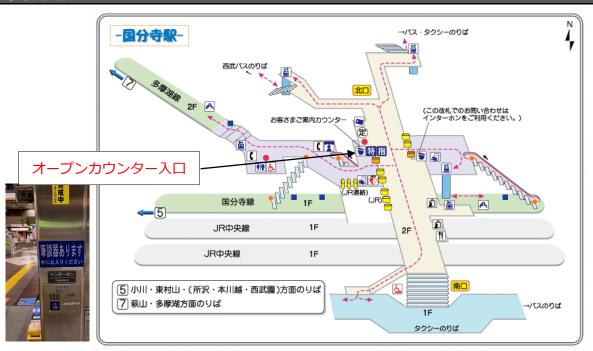

整備対象

都道 145 号立川国分寺線(多喜窪 通り・丸山通り)


対象事業者名 東京都

### 事業内容・実施時期

于不	<b>《八日》</b> 大心时知													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田力	尹未り日	箇所数	時期				短期					長期		
1				ch46n+440	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
	視覚障害者誘導用ブロック	200m	継続	実施時期					※検	討中		,		
_	の改善・設置	200111	検討	備考	・適切	な維持	管理を	継続し	て実施					
				進捗状況										
1				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	  歩道の勾配の改善	200m	継続	<b>夫</b> 爬时期	[				※検	討中		,		
_		200111	検討	備考	・継続	検討								
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	  歩道の有効幅員確保	200m	継続	<b>夫</b> 爬时期					※検	討中		,		
'	多色の自効幅負権保	200111	検討	備考	・未定						,			
				進捗状況										
   ~				<b>⇔</b> 44-n±+0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
「 の				実施時期										
他				備考			ı				ı			
16				進捗状況										

### 実施済項目

### その他事項

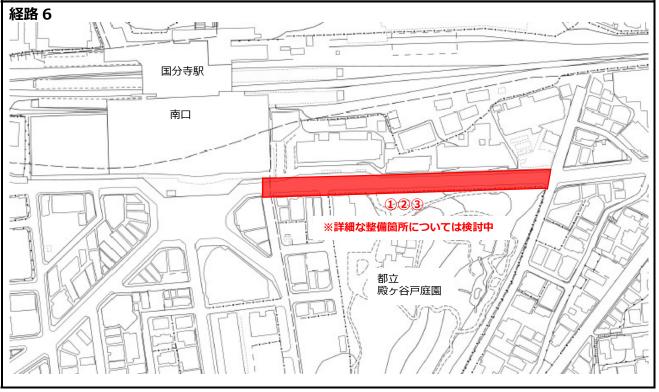

#### 道路特定事業 都道 145 号立川国分寺線(多喜窪 対象事業者名 整備対象 東京都 通り) 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 R7 R8 R9 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 継続 ※検討中 100m 1 の改善・設置 検討 備考 ・適切な維持管理を継続して実施 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R5 R6 R7 R8 R9 実施時期 継続 ※検討中 2 歩道の勾配の改善 100m 検討 備考 継続検討 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 R7 R8 R9

実施時期

備考

進捗状況

実施時期

備考

進捗状況

※検討中

R8

R9

R10

R11

R12

R13

・適切な維持管理を継続して実施

R6

R7

R5

R4

継続

検討

100m

### 実施済項目

3

そ

の

他

歩車道境界部の段差の改善

# その他事項

# 事業箇所図 経路 9 国分寺駅 南口 122 ※詳細な整備箇所については検討中 股ケ谷戸庭園

#### 道路特定事業 都道 145 号立川国分寺線(多喜窪 対象事業者名 整備対象 東京都 通り) 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R5 R6 R10 R11 R12 R13 R4 R7 R8 R9 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 継続 ※検討中 200m 1 の改善・設置 検討 備考 ・適切な維持管理を継続して実施 進捗状況 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 R7 R8 実施時期 備考 進捗状況 R13 R7 R10 R11 R12 R4 R5 R6 R8 R9 実施時期 備考 進捗状況 R10 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 経路 13 都立 武蔵国分寺公園 Addition of the second ※詳細な整備箇所については検討中 国分寺市立 第四小学校 都立

D

武蔵国分寺公園

対象事業者名 整備対象 市道幹5号線(駅前通り) 国分寺市

### **重**業内窓・宝施時期

尹未	『内谷・夫旭吋期													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
ш. э	72.71	箇所数	時期				短期					長期		
				######################################	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	  安全な歩行空間の整備	約 330	長期	実施時期										
1	文工/6岁月工间00正师	m	100	備考 進捗状況		方針の 調整し			• 4 •	12 号約	泉の整備	前に合わ	つせ、関	係部
				\$45.H\$40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	歩行者主体の道づくりの	約 330	長期	実施時期										
	検討	m	18741	備考 進捗状況		·4·12 必要な			捗を鑑	み,ま	ちづく	り協議	会の活	動に対
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				天爬时期										
				備考 進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
<sub>て</sub>				天爬吋期										
他				備考										
				進捗状況										

### 実施済項目

### その他事項

・市まちづくり条例に基づき認定した「北口駅前通り交通安全まちづくり協議会」により、歩行者が安全かつ安心に歩行 できる道等の実現について検討中。(R5にまちづくり協議会を1回開催)




整備対象 市道幹7号線(駅前通り以東) 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

于木	に対合・天心时知													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田力	<b>子未</b> り日	箇所数	時期				短期					長期		
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	  歩車道境界部の段差の改善	   1か所	短期	実施時期										
1	少年担境が即の技差の以告	1 /3 /7/1	\ <del>11\1</del> \1	備考 進捗状況	・計画	工事(	舗装補	修工事	等)に	あわせ	て対応	する。	•	
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	  歩道の勾配の改善	3か所	継続	実施時期					※検	討中				
_	多色の勾配の改善	וחינו כ	検討	備考	・関係	機関,	関係部	署と調	-  整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	す
				進捗状況	る。									
				中作吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	視覚障害者誘導用ブロック	   9か所	短期	実施時期										
	の改善・設置	9 13 771	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	備考 進捗状況	・計画				等) に 応する		て対応	する。	•	
-				连抄1人儿	_				ł .					
<sub>7</sub>				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
l o														
他				備考										
				進捗状況										

### 実施済項目

### その他事項

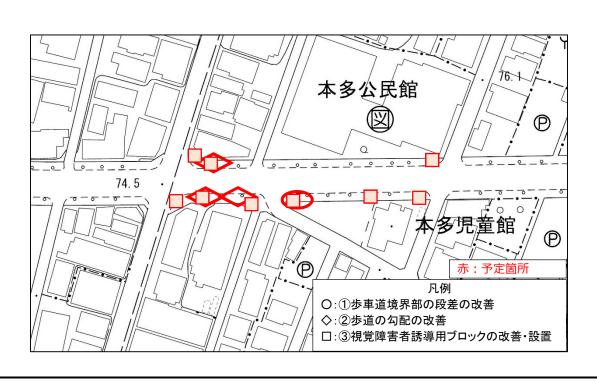

#### 道路特定事業 整備対象 市道幹7号線(駅前通り以西) 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R10 R11 R12 R13 R5 R6 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 7か所 長期 1 の改善・設置 ・計画工事(舗装補修工事等)にあわせて対応する。 備考 進捗状況 -部維持管理工事にて対応する。 R5 R6 **R7** R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 2 備考 進捗状況 R7 R8 R10 R11 R12 R13 R5 R6 実施時期 3 備考 進捗状況 R11 R12 R13 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 R10 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 76.6 · 75. 2 75. 9 74.5 商工会館 Q 75.2 赤:予定箇所 Q 凡例 75.2 □:①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置

#### 道路特定事業 市道東1号線 東30号線 対象事業者名 整備対象 国分寺市 東 40 号線 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8 実施時期 継続 ※検討中 安全な歩行空間の整備 未定 1 検討 備考 ※関係機関,関係部署と調整し,実施時期や整備内容を検討する。 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 R7 R8 R9 実施時期 2 備考 進捗状況 R12 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R13 実施時期 3 備考 進捗状況 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 本多公民館 本多図書館 東1号線 ※詳細な整備箇所については検討中 歌唱 東30年 国分寺市立 第二中学校 国分寺市立 第七小学校

#### 道路特定事業 整備対象 市道幹4号線 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 延長(m) 箇所数 実施時期 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 2 か所 短期 1 の改善 ・維持管理工事にて対応 備考 ・1箇所について、令和6年度対応予定 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 実施時期 2 備考 進捗状況 R11 R4 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 R5 実施時期 3 備考 進捗状況 R6 **R7** R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 本町二丁目 交差点 国分寺駅 北口広場 赤:予定箇所 凡例 □:①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 71 1//

#### 道路特定事業 整備対象 市道南 96 号線 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 延長(m) 箇所数 実施時期 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R10 R11 R12 R13 R5 R8 実施時期 ※検討中 継続 安全な歩行空間の整備 未定 検討 ※関係機関,関係部署と調整し,実施時期や整備内容を検討する。 備考 進捗状況 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 R7 実施時期 2 備考 進捗状況 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R6 実施時期 3 備考 進捗状況 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 国分寺駅 南口 年度区画線引き直し 南町二丁目交差点 都立 [ 殿ヶ谷戸庭園

整備対象 市道南 103・106 号線 対象事業者名 国分寺市


### 事業内容・実施時期

争录	長内谷・美施時期 アンスティ													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
ВЭ	チ末い口	箇所数	時期				短期					長期		
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
	  歩車道境界部の段差の改善	   2か所	短期	実施時期			·	·	※検	討中			<del>,</del>	
	少年追続が同の技権の以告	2 /3 /7/1	747741	備考 進捗状況	・R4 ៖ ・計画					(南 10 あわせ			(南 106	号線)
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	視覚障害者用誘導ブロック	   7か所	短期	実施時期										
	の改善・設置	7 73 771	747741	備考 進捗状況	・計画	工事(	舗装補	修工事	等) に	あわせ	て対応	する。		
				ch460+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	歩行空間の連続性確保の整	   1か所	継続	実施時期	[	<del></del>	<del></del>	<del></del>	※検	討中	<del>'</del>		<del></del>	
	備	1 /3'17/1	検討	備考 進捗状況	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
_ て				天心时期										
他				備考	•									
				進捗状況										

### 実施済項目

・歩車道境界部の段差の改善(1か所)実施済み。

### その他事項

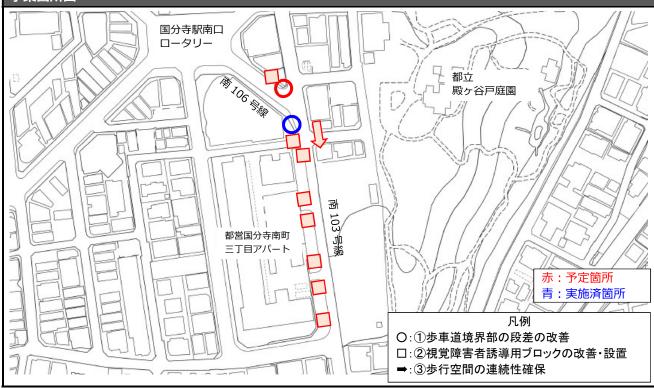

#### 道路特定事業 整備対象 市道南 101 号線 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R10 R11 R12 R13 R6 R8 実施時期 ※検討中 継続 歩道の勾配の改善 未定 検討 備考 ※関係機関,関係部署と調整し,実施時期や整備内容を検討する。 進捗状況 R9 R11 R12 R13 R5 R6 R7 R8 R10 実施時期 継続 ※検討中 歩道の有効幅員確保 未定 検討 ※関係機関,関係部署と調整し,実施時期や整備内容を検討する。 備考 進捗状況 R11 R12 R10 実施時期 3 備考 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 . 72. 6 1 ※詳細な整備箇所については検討中 12 都営 国 分寺南町主丁目アパ P ® 町

Ļ

#### 道路特定事業 整備対象 市道南 100・109・113 号線 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R5 R6 R8 R10 R11 R12 R13 実施時期 ※検討中 継続 安全な歩行空間の整備 未定 検討 ※関係機関,関係部署と調整し,実施時期や整備内容を検討する。 備考 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 実施時期 2 備考 進捗状況 R11 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R12 R13 実施時期 3 備考 進捗状況 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 そ 実施時期 の 備考 他 進捗状況 実施済項目 その他事項 事業箇所図 国分寺駅南口 ロータリー 東京都国分寺 労政会館 都営国分寺南町 三丁目アパート 南町三丁目交差点 南109号線

## 道路特定事業 整備対象

市道南 115・120 号線・295 号 線

対象事業者名

国分寺市


### 事業内容・実施時期

尹未	ドハ谷・天心吋朔													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田力	尹未广泊	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
	  歩車道境界部の段差の改善	   1か所	短期	天心时期										
†	ラールの作品の技法の成合	1/3///	7,77,41		実施済	み								
				進捗状況									ı.	
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	  歩道の勾配の改善	   3か所	継続	×//840/40					※検	討中	,			
_		3/3///	検討	備考	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
ļ				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	視覚障害者誘導用ブロック	   2か所	短期	×1/8-1741										
	の改善・設置	2/3///	711743	備考	・歩道	の勾配	の改善	と同時	対応が	必要				
				進捗状況									ı.	
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	  歩道の有効幅員確保	   2か所	継続	大ルビザ州				,	※検	討中		,	·	
Ι΄.		2/3///	検討	備考	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
				進捗状況						ı				
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
<b> </b> 5	歩行空間の連続性確保の整	未定	継続	天//世界/					※検	討中				
	備		検討	備考	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
				進捗状況										

### 実施済項目

・歩車道境界部の段差の改善について実施済み。

### その他事項

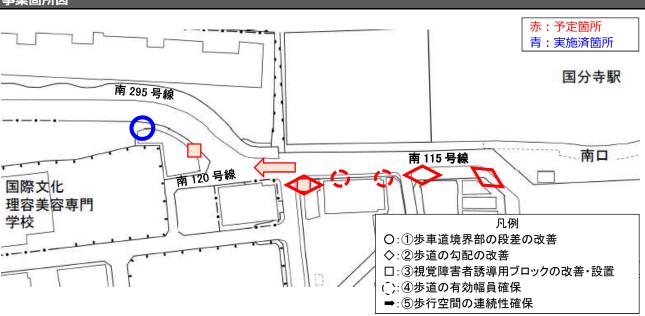


整備対象 市道幹5号線 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

事录	長内谷・美施吋期 アイス・アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田力	<b>子未</b> に3日	箇所数	時期				短期					長期		
				<b>⇔</b> +⊁n+++0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			継続	実施時期					※検	討中				
1	歩道の勾配の改善	1か所	検討	備考	※西武	多摩湖	線跨道	橋及び	埋設物	との位	置関係	から、	勾配の	改善に
				通与 進捗状況		っては	、技術	的検討	や関係	機関・	関係部	署との	調整を	要す
				~	る。									
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1 2	  歩道の有効幅員確保	   2か所	継続	<b>X</b>				,	※検	討中	,			
_		2/3///	検討	備考	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	安全な歩行空間の整備	未定	継続	天心时期					※検	討中				
'	女主な多り主的の金婦		検討	備考	※関係	機関,	関係部	署と調	整し,	実施時	期や整	備内容	を検討	する。
				進捗状況										
				c>++-n±+0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考			ı				ı			
18				進捗状況										

### 実施済項目

### その他事項

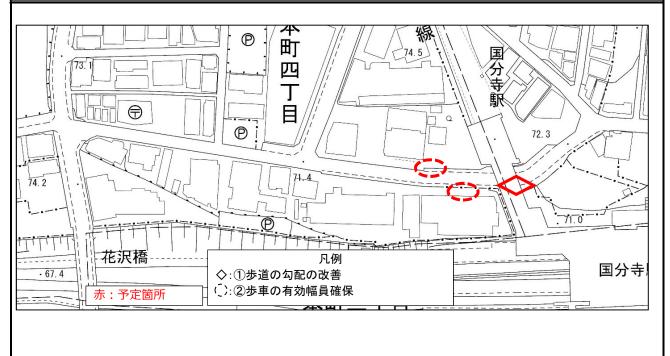

整備対象 市道東3号線 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

J 71														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田勺	チ未じせ	箇所数	時期				短期					長期		
				C245-04-00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	  安全な歩行空間の整備	約 70m	継続	実施時期										
1	文工/8岁门工间***	5 箇所	検討	備考	• R5 £	F度、B	各面表表	示を施]	L.					
				進捗状況										
				ch14-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
_				備考	•				•	•				
				進捗状況										
				字标吐烟	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
٦				備考	•				•	•				
				進捗状況										
_				c>++-n±+00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考	•		•	•		•	•	•	•	
16				進捗状況										

### 実施済項目

歩行空間を確保するために、路面上に「ここは歩道です。通行の妨げとなる看板等の物を置かないで下さい」との表示を行った。

### その他事項

路面表示による効果を鑑みて、今後も安全な歩行空間を創出すべく、対策を検討していく。

### 事業箇所図

### 路面表示

ここは歩道です 音行の妨げとなる看板等の物を置かないで下さい 取が中市



整備対象 市道南 307 号線 対象事業者名 国分寺市


### 事業内容・実施時期

<b>5</b> 7														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	7,20,71	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	地区計画に合わせた歩行空	約 260	短期	<b>夫</b> 厄吋期										
_	間の適切な確保	m	722, 73	備考 進捗状況				て, 既 携して			いる歩: 。	行空間	と一帯	となる
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
_				備考 進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				天心时期										
				備考 進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の				天心时期										
他				備考										
180				進捗状況										

### 実施済項目

・都立多摩図書館及び都立公文書館については既に整備済のため、当該施設の接する箇所については、歩行空間が確保されている。

### その他事項

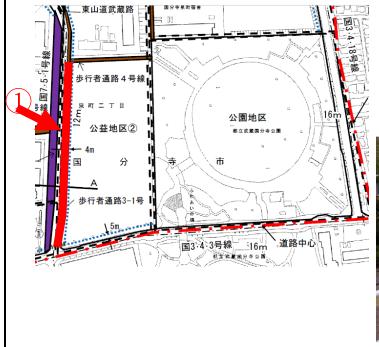



#### 都市公園特定事業 対象事業者名 整備対象 都立武蔵国分寺公園 東京都 事業内容・実施時期 実施時期 目標 時期 延長(m) 番号 事業内容 箇所数 短期 長期 R5 R6 R8 R10 R11 R12 R13 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 約 継続 1 検討 の改善 600m ・園内全域で600mと延長が長いため、事業化(予算措置等)にこ 備老 進捗状況 いて現時点では未定。 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 劣化した案内板の改修 済 2 未定 ・ユニバーサルカラーを採用した案内板へ改修。点字パンフレット 備考 の貸し出しや、管理者や利用者による合理的配慮により対応を実 進捗状況 施している。 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 トイレへのオストメイト用 継続 3 未定 設備の設置 検討 備考 新たな下水管連結などの整備工事が必要となるため、トイレの改 修(築)時にあわせての実施となる。(改築時期未定) 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 トイレへのベビーチェアの 継続 4 未定 検討 設置 備考 ・男女トイレの個室ブースが狭いため改修は未定。 進捗状況 R5 R13 R4 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 実施時期 トイレの音声案内の改善 短期 未定 備考 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 実施時期 ※検討中 車いす使用者が利用できる 長期 未定 6 ・野外卓の劣化による更新時に合わせて実施する。(現時点で目立 野外卓の設置 備考 った劣化は無いため、時期については今後状況を見ながらの判断 進捗状況 となる) R4 R5 R6 **R7** R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 $\sigma$ 備老 他 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 $\mathcal{O}$ 備考 他 進捗状況 実施済項目 ○色覚障がいの方のために、園内の掲示をユニバーサルカラーデザインに変更した。 その他事項 事業箇所図



#### 都市公園特定事業 都立殿ヶ谷戸庭園(開放公園区 対象事業者名 整備対象 東京都 域) 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 車いす使用者やベビーカー 実施時期 1 使用者が円滑に出入りでき 14 2 短期 備考 る2つ目の出入口の確保 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 視覚障害者誘導用ブロック 短期 2 14.2 の設置 備考 進捗状況 R10 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R11 R12 R13 実施時期 園路にある排水溝の蓋を目 短期 3 6 の細かいものへ交換 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 トイレへのオストメイト用 ※検討中 継続 未定 4 検討 設備の設置 ・トイレ改修(築)時に合わせて実施する。 備考 (改修時期は現時点で未定) 進捗状況 R4 R5 R6 R10 R11 R12 R7 R8 R9 R13 実施時期 トイレへのベビーチェアの 継続 ※検討中 5 未定 検討 設置 ・トイレ改修(築)時に合わせて実施する。 (改修時期は現時点で未定) 進捗状況 R5 R10 R11 R12 R6 R7 R8 R13 R9 実施時期 トイレへのベビーベッドの 継続 ※検討中 未定 6 検討 設置 ・トイレ改修(築)時に合わせて実施する。 (改修時期は現時点で未定) 進捗状況 R7 R10 R11 R12 R4 R5 R6 R8 R9 R13 そ 実施時期 R5 年 園路の段差解消 の 2月 実施済 他 進捗状況 R4 R5 R6 **R7** R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 の 他 進捗状況


### 実施済項目

- ・平成30年度に、女子便所の段差解消工事を行った。
- ・令和4年度に、公園各所で園路の段差解消を行った。

(側溝と砂地面との間にあった  $2\sim3$  cmの段差を解消するため、該当箇所をアスファルトですりつける舗装を行った。また、植樹付近のインターロッキング舗装について、樹木の根の影響で段差ができている箇所があったため、それを解消するための補修を行った。)

### その他事項

・令和 5 年度に、車いす使用者やベビーカー使用者の 2 つ目の出入り口となる箇所を現地にて検討した。車止め撤去や視覚障害者誘導用ブロックの設置も合わせて検討した。

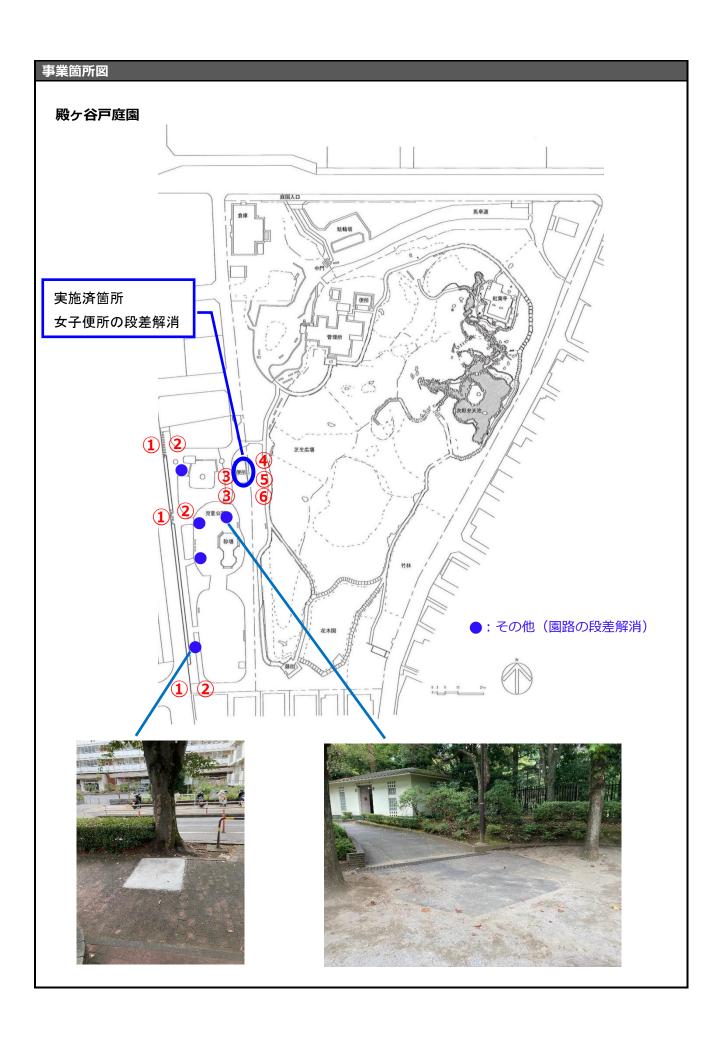

整備対象 国分寺市案内所 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

7.7										n-t-440				
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	7 J. II. 3	箇所数	時期				短期					長期		
				c514-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	  出入口の有効幅の確保	1 1か所	短期	実施時期										
-	四八口の自効幅の確保	1/3/7/1	ν <del>ην</del> η.	備考										
				進捗状況										
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
٦	視覚障害者に配慮した出入	4/2 A	短期	実施時期										
2	口までの誘導案内の設置	約4m	長期	備考	管理組	合等と	調整し	、検討	する。	<u>l</u>	L		<u>l</u>	
			1次州]	進捗状況										
				c514-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	筆談ツールの準備とその表	1 +\\ ==	短期	実施時期										
٦	示の設置	1か所	<del>范州</del>	備考	実施済					ı			ı	ı
				進捗状況										
_					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
の				備考		ı						ı		1
他				進捗状況										


### 実施に必要な資金額及び調達方法

・番号1及び2については、該当箇所に共用部が含まれるため、事業実施に必要な経費等は施設の管理組合と協議の上、 決定していく。

### 実施済項目

・番号3については、実施済み。

### その他事項

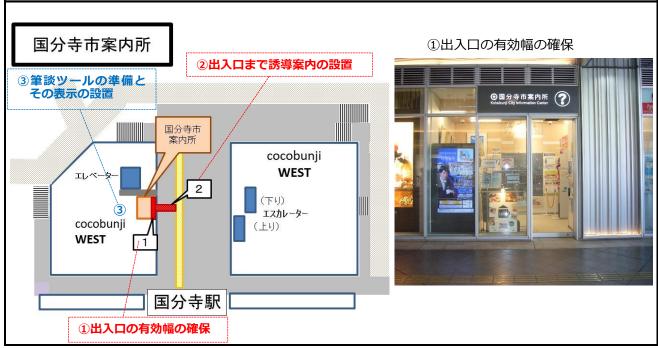

整備対象 cocobunji プラザ 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

, ,,															
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期					
ш	7	箇所数	時期			短期					長期				
			短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	筆談対応を示す表示の設置	1か所		大ルビザカ											
_	- LOVING CAT PAGE	270771			実施済										
				進捗状況											
				中作吐烟	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
2				実施時期											
_				備考											
				進捗状況											
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
3				実施時期											
٦				備考			•	•		•	•	•			
				進捗状況											
7				c=++-n±++n	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
その				実施時期											
他				備考											
16				進捗状況											


### 実施に必要な資金額及び調達方法

・実施に必要な経費はなし

### 実施済項目

・番号1については,実施済み。

### その他事項

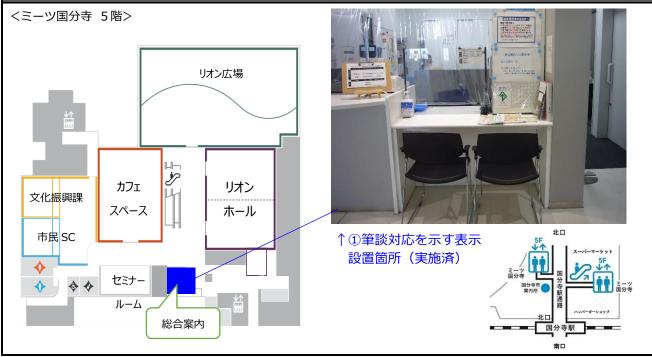

整備対象

アクティ・ココブンジ

対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

3 3															
番号	事業内容	延長(m)	目標 時期		実施時期										
1	72070	箇所数					短期					長期			
			短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	  筆談対応を示す表示の設置	1 か所													
	- DOSNO COO PORTO			備考 進捗状況	設置済み。										
				\$44-n±40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
2				実施時期											
				備考 進捗状況											
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
3				天心时期											
				備考 進捗状況											
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
っ の				天心时期											
他				備考		•	•	•			•	•	•		
				進捗状況											

### 実施に必要な資金額及び調達方法

・表示の設置に関わる費用は不要。


### 実施済項目

・筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置済み。

### その他事項

### 事業箇所図

筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置

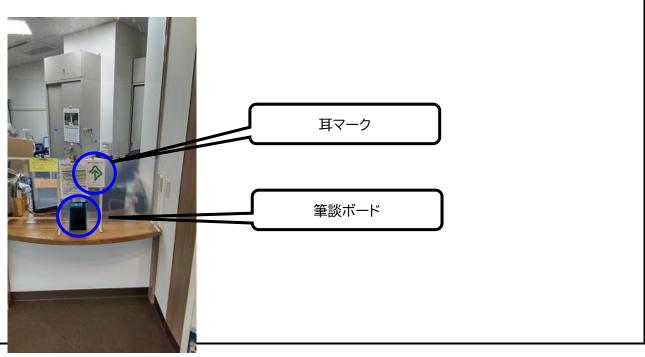

整備対象 本多公民館 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

T'A	577日 · 大心时知													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
ш-7	72.11	箇所数	時期				短期					長期		
			短期		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	車いす使用者に対応したカ	1か所		実施時期										
1	ウンターの設置			備考 進捗状況	・令和5年度設置済									
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	トイレへの大型ベッドの設置	1か所	短期											
-				備考	・令和	3年度	バリア	フリー	トイレ	改修時	に設置	済		
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				天心时期										
				備考 進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の				天心时期										
他				備考										
ان				進捗状況										


### 実施に必要な資金額及び調達方法

### 実施済項目

・車いす使用者に対応したカウンターの設置・・トイレへの大型ベッドの設置

### その他事項

・トイレへの大型ベッドの設置にあわせ、トイレの適正利用について利用者への広報を実施する。

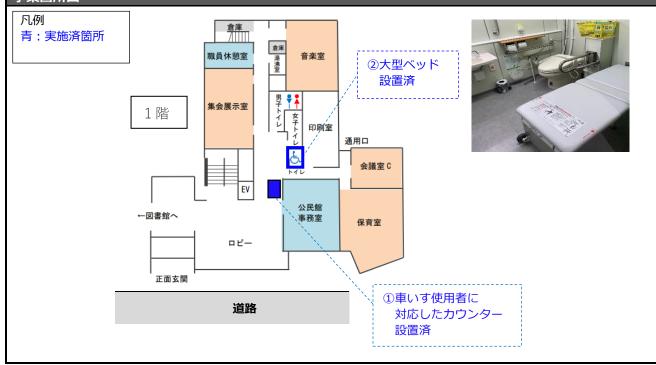

整備対象 本多図書館 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

尹未	尹未り谷・天旭吋朔															
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標時期			実施短期					長期					
			-9703				7位4月					1支州				
	視覚障害者に配慮した主要な出 入口から受付までの誘導案内の 設置 (視覚障害者誘導用ブロッ クの付け替え)			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
1		1か所	短期	備考 進捗状況	・実施	・実施済										
	階段・スロープへの手すり の設置		継続検討		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
2		1か所			※検討中											
				備考 進捗状況												
				<b>⇔</b> 110 + 40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
3				実施時期												
				備考 進捗状況												
そ				宇佐吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
<sub>て</sub>				実施時期												
他				備考												
ات				進捗状況												


### 実施に必要な資金額及び調達方法

- ・必要な経費等は、事業の具体化にあわせて決定していく。
- ・現状の使用状況を確認しながら, 設置可能か等を検討していく。

### 実施済項目

・視覚障害者誘導用ブロック付け替え済み

### その他事項

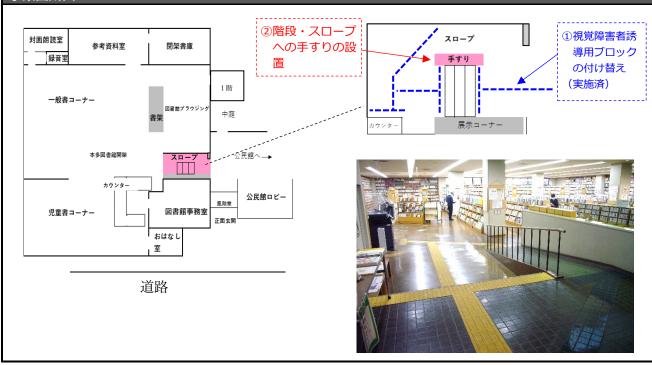

整備対象 本多図書館駅前分館 対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

<b>5</b> 3	(P) <del>C</del>				実施時期									
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	, , , , ,	箇所数	時期				短期					長期		
		1か所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談ツールの準備とその表			大心时和										
_	示の設置	1/3///	, 11, 11	備考	・実施済									
				進捗状況										
				字标吐烟	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
_				備考		•	•	•		•				
				進捗状況										
				\$#F1##0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
٥				備考		U								,
				進捗状況										
7					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
の				備考		l.	1	1	1	1		1	1	1
他				進捗状況										

### 実施に必要な資金額及び調達方法


- ・他館が所有している筆談ツール(ホワイトボード、マーカー,イレーサー)を移管。
- ・他館カウンターで設置しているものと同様な表示を設置。

### 実施済項目

・令和4年度に筆談ツール及び表示を設置済

### その他事項

・表示で筆談ツールの用意があることを案内し、利用者がカウンターで気軽に問い合わせができるよう対応を行っていく。

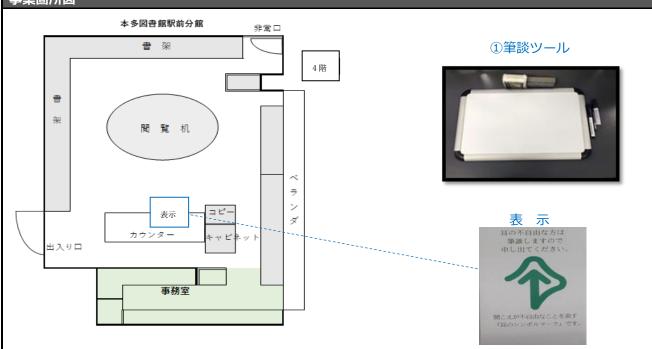

#### 建築物特定事業 国分寺駅北口事務所 対象事業者名 国分寺市 整備対象 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 時期 番号 事業内容 長期 短期 R10 R11 R12 R13 実施時期 道路から出入口までの経路 ※検討中 継続 1 1 か所 検討 の段差解消 備老 ・※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 視覚障害者に配慮した道路 実施時期 ※検討中 継続 から窓口までの誘導案内の 約 40m 2 検討 備老 ・※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。 設置 進捗状況 R10 R11 R12 R5 R6 R8 R9 R13 実施時期 階段上端部への点状ブロッ ※検討中 継続 3 1 か所 検討 クの設置 備考 ・※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。 進捗状況 R10 R11 R12 R5 R7 R8 R9 R13 実施時期 継続 ※ 検討由 4 階段への手すりの設置 1 か所 検討 ・※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 筆談ツールの準備とその表 5 1 か所 短期 示の設置 備考 筆談ツール及びその表示の設置済。 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 車いす使用者用トイレの設 継続 ※検討中 1 か所 6 検討 置 ・※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。 備考 進捗状況 R6 R7 R8 R10 R11 R12 R13

実施時期

備考

進捗状況

### 実施に必要な資金額及び調達方法

・実施内容を含め、必要な経費等は事業の具体化にあわせて決定していく。

### 実施済項目

そ

 $\sigma$ 

他

・番号5 筆談ツール及びその表示の設置。

### その他事項



整備対象

本町・南町地域センター

対象事業者名 国分寺市

### 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標時期		実施時期										
ш	72.71	箇所数					短期			長期					
	視覚障害者に配慮した道路			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	から出入口までの誘導案内	1 1か所	長期	天爬时期											
	の設置	1/37/1	区州	備考 進捗状況		・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定 ・マンション管理組合の所有地であるため,協議を要する。									
			短期		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
2	筆談ツールの準備とその表 示の設置	1か所		実施時期											
_				備考	・筆談	ツール	設置済	み。		•	•	•			
				進捗状況											
			短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
3	トイレへのオストメイト用	1 +\\000		大旭吋和											
	設備の設置	1 か所 		備考 進捗状況	・公共	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定									
				中作吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
4	トイレへのベビーチェアの 設置	1か所	短期	実施時期											
+				備考 進捗状況	・公共	施設個	別施設	計画実	施に合	わせて	設置予!	<u></u> 定			

### 実施に必要な資金額及び調達方法


・公共施設個別施設計画実施に合わせて適宜,実施する。

### 実施済項目

・筆談ツールの設置。

### その他事項

・番号1については、マンション管理組合の所有地に設置する必要があるため、協議を要する。

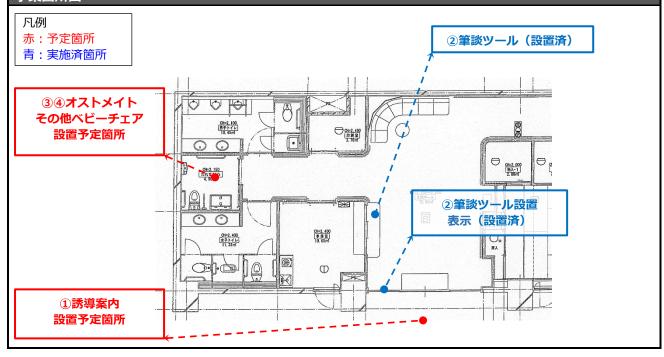

#### 建築物特定事業 第七小学校 対象事業者名 整備対象 国分寺市 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 目標 時期 番号 事業内容 箇所数 短期 長期 R5 R10 R11 R12 R13 実施時期 道路から主要な出入口まで 短期 1 未定 の経路の段差解消 ・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築棟までの経路 備老 進捗状況 について段差処理対応済。 R5 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 排水溝の蓋を目の細かいも 短期 2 未定 のへ交換 備老 ・令和5年度に実施した校舎増築丁事において、増築棟までの経路 進捗状況 上の排水溝の蓋について交換済。 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 実施時期 主要な出入口から受付まで 継続 ※検討中 3 未定 検討 の経路の段差解消 ・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 備考 進捗状況 対応を検討 R8 R9 R10 R11 R12 実施時期 エレベーターの設置 4 1か所 短期 ・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 階段上端部への点状ブロッ 5 短期 未定 クの設置 令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置 備考 進捗状況 R5 R7 R8 R9 R10 R11 視覚障害者に配慮した道路 実施時期 継続 ※検討中 6 から受付までの誘導案内の 未定 検討 ・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 備考 設置 進捗状況 対応を検討 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 7 筆談ツールの準備 短期 1か所 早期に実施予定 進捗状況 R12 R10 R13 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R11 実施時期 そ 継続 バリアフリートイレの設置 $\sigma$ 1か所 検討 ・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置

進捗状況

### 実施に必要な資金額及び調達方法

・事業実施に必要な経費等は, 庁内で協議していく。

### 実施済項目

- ・筆談対応の表示済み
- ・令和5年度に実施した校舎増築工事において、項目1,2,4,5について対応済。

### その他事項

### 事業箇所図



②排水溝の蓋を目の細かいものへ交換



④エレベーターの設置



⑤階段上端部への点状ブロックの設置



その他 バリアフリートイレの設置

### ⑦筆談ツールの準備予定箇所 (表示は設置済)



整備対象

第二中学校

# 対象事業者名 国分寺市

## 事業内容・実施時期

<i>3</i> ×		_		1										
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
_ ,	320.32	箇所数	時期				短期	•				長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から主要な出入口まで	未定	継続	<b>美</b> 胞 时期					※検	討中				,
1	の経路の段差解消	<b>不</b> 足	検討	備考	・市全	体の学	校施設	に係る	バリア	フリー	化計画	や学校	施設更	新時に
				進捗状況	対応	を検討								
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	排水溝の蓋を目の細かいも	+=	短期	実施時期										
	のへ交換	未定	万 <del>万</del>	備考	・修繕	実施の	緊急度	等を勘	案し,	対応を	検討			
				進捗状況					•					
	お お は は は は は は は は に は に に に に に に に に に に に に に				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	視覚障害者に配慮した道路	+-	継続	実施時期		L	<del></del>	<del></del>	※検	討中	<del>)</del>	J	<del></del>	
3	から受付までの誘導案内の設置	未定	検討	備考	・市全	<del></del> 体の学	校施設	に係る	バリア	'フリー	化計画	<u></u> や学校	 施設更	新時に
	改造			進捗状況	対応	を検討								
				ch460+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	   Tレベーターの設置	1か所	継続	実施時期			t	L	※検	討中	J	J	J	
4	エレバーターの設置	1 13 1711	検討	備考	・市全	<u>体の学</u>	校施設	に係る	バリア	<u>'</u> フリー	化計画	<u></u> や学校	<u>施設更</u>	新時に
				進捗状況	対応	を検討	•							
				ch14-n+440	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
5	  筆談ツールの準備	1 1か所	短期	実施時期										
5	軍級ソールの準備	1 1) YP/T	7位5月	備考	・早期	に実施	予定							
				進捗状況										
7				<b>⇔</b> ₩n±₩n	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
の他				備考		l	1	1	1		1	1	1	
16				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。

## 実施済項目

・筆談対応の表示済み

## その他事項

## 事業箇所図



①道路から主要な出入口までの経路の段差箇所



⑤筆談ツールの準備予定箇所 (表示は設置済)

整備対象第四小学校

## 対象事業者名 国分寺市

## 事業内容・実施時期

-	(1)11 )(1)2-3/11													
番号	事業内容	延長(m)							実施	時期				
ш-)	ナボ! 1日	箇所数	時期				短期					長期		
				\$\tau_1\tau_1	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談ツールの準備とその表	1 箇所	短期	実施時期										
1	示の設置	1 13/71	732743	備考	・早期	に実施	予定							
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	トイレへのオストメイト用	1 箇所	長期	大心时知										
-	設備の設置	1 12///	10,773	備考	・令和	11年	度,大	規模改	造工事の	の設計	において	て設置	<b>倹討</b>	
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	トイレへのベビーチェアの	1 箇所	長期	大ルビザカ										
	設置	1 10//1	10,773	備考	・令和	11年	度,大	規模改	造工事の	の設計	において	て設置	倹討	
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	トイレへのベビーベッドの	1 箇所	長期	天心时期										
-	設置	工四川	127/1	備考	・令和	11年	度,大	規模改	造工事の	の設計	におい	て設置	<b>倹討</b>	
				進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ر ص				大/旭吋和										
他				備考										
165				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。

## 実施済項目

- ・道路から主要な出入口までの段差解消済み (スロープあり)。
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置済み
- ・エレベーター設置済

## その他事項

## 事業箇所図



道路から主要な出入口までの経路の段差解消済み



視覚障害者誘導用ブロック設置済み

整備対象 本多児童館 対象事業者名 国分寺市

## 事業内容・実施時期 \_\_\_\_

<b>-</b>			_		,									
番号	事業内容	延長(m)							実施	時期				
田つ	子来门口	箇所数	時期				短期					長期		
	   視覚障害者に配慮した道路			<b>学标吐彻</b>	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	から出入口までの誘導案内	1ヶ所	継続	実施時期	[		,		※検	討中				
	の設置	1 2 //1	検討	備考		児童館	長寿命	化大規	模修繕	の具体	化にあ	わせて	決定し	てい
				進捗状況	<.									
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	階段上端部への点状ブロッ	1ヶ所	短期	X//840/K/I					※検	討中				
	クの設置	1 2 //1	711743	備考		児童館	長寿命	化大規	模修繕	の具体	化にあ	わせて	決定し	てい
				進捗状況	<.									
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	  筆談対応を示す表示の設置	1ヶ所	短期	X//840/H/J										
	中欧州市 とパク 弘力(の)版色	1 2 //1	711743	備考	実施済									
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	車いす使用者用トイレの改	1ヶ所	継続	大心时知	[		,	,	※検	討中				
'	修	1 0 //1	検討	備考	・本多	児童館	長寿命	化大規	模修繕	の具体	化にあ	わせて	決定し	てい
				進捗状況	<.									
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ての				天爬吋州										
他				備考										
تا ا				進捗状況										


## 実施に必要な資金額及び調達方法

・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。

#### 実施済項目

・筆談対応を示す表示の設置

# その他事項

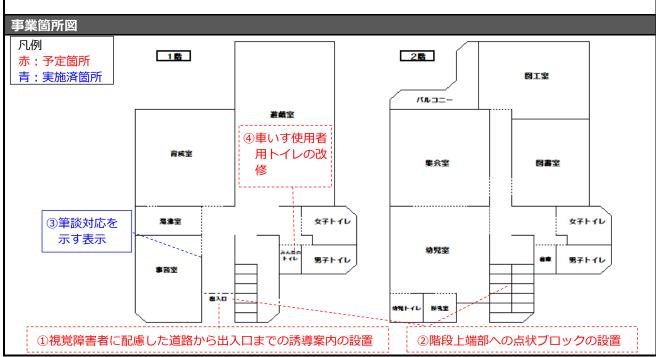

整備対象 地域包括支援センターほんだ 対象事業者名 国分寺市

## 事業内容・実施時期

3 3														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
		箇所数	時期				短期					長期		
	視覚障害者に配慮した出入			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	口から受付までの誘導案内	未定	継続	大心时知					※検	討中				
	の設置	711	検討	備考 進捗状況	・関係	団体等	と調整	し検討	する。					
				C346-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	  筆談対応を示す表示の設置	1 1か所	短期	実施時期										
	=欧/川心でがり私が少成直	1/3///	747741	備考 進捗状況	・筆談	対応を	示す表	示を窓	ロカウ	ンター	に設置	した。		
				\$#c###	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				実施時期										
				備考 進捗状況	•									
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の				<b>天</b> 爬时期										
他				備考	•									
				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・実施内容を含め、必要な経費等は関係団体等と調整のうえ事業の具体化にあわせて決定していく。

## 実施済項目

・建物入り口部分及び階段の視覚障害者誘導用ブロック設置,車いす対応エレベーター設置(音声案内有り),建物内の段差解消,車いす使用者用トイレ設置,車いす使用者用駐車場設置,筆談用具設置,筆談対応を示す表示の設置

## その他事項

## 事業箇所図

②筆談対応を示す表示の設置箇所



整備対象 地域生活支援センタープラッツ 対象事業者名 社会福祉法人はらからの家福祉会

## 事業内容・実施時期

7-7														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	• J.H. 5 Z.	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から出入口までの経路	5m	継続	天心时期					※検	討中	,	·		
	の段差解消	3111	検討	備考 進捗状況	・※施	設改修	の実施	時期に	合わせ	て検討	する。			
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	筆談ツールの準備とその表	1か所	短期	実施時期										
	示の設置	1 /3 //1	277741	備考 進捗状況	・令和	4 年度	内に設	置を行	った。					
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				<b>天</b> 爬时期										
				備考 進捗状況	•									
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ر ص				大心时期										
他				備考	•									
"				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・必要な経費等は事業の具体化にあわせて決定していく。

## 実施済項目

- ・出入り口の幅は確保済、階段に手すりを設置済。
- ・筆談ツールを設置済

## その他事項

・歩道の勾配の改善は、周辺設備等の修繕との調整を行いながら進める。

#### 事業箇所図 洗面台 トイレ 階段 階段下 収納 トイレ 職員 用口 ②筆談具を ッカ 設置 事務所 貸出 用車 イス 机 利用者交流室 靴 靴 箱 ①段差あり 箱 車イス走行不可 自販機 道路

整備対象 東部拠点地区親子ひろば

対象事業者名 国分寺市

## 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
_ ,	5 J.H. 5 <u>—</u>	箇所数	時期				短期					長期		
				\$#F####	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	  出入口の有効幅の確保	1か所	継続	実施時期	[			,	※検	討中				
*	四八口の日が幅の確保	1 /3 / //	検討	備考	・施設	改修等	の機会	を捉え	,実施	を検討	。(建物	所有者	まとの調	整が
				進捗状況	必要	)								
	  視覚障害者に配慮した道路			<b>⇔</b> ₩:n±₩0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	祝見障害者に配慮した連路   から出入口までの誘導案内	1 1か所	継続	実施時期	[			<del></del>	※検	討中				
_	の設置	1 /3/7/1	検討	備考	・施設	改修等	の機会	を捉え	,実施	を検討	。(建物		さとの調	整が
	の設置			進捗状況	必要	)								
				中华吐姆	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	筆談ツールの準備とその表	1か所	短期	実施時期										
٦	示の設置	1 /3/7/1	心立地	備考	実施済			•		•				
				進捗状況										
7				ch16-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考				•		•				
1世				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・番号1および番号2に係る必要な経費等は,事業の状況にあわせて決定予定。

## 実施済項目

令和4年度に、3筆談ツールの準備とその表示の設置を実施済 親子ひろば出入り口に筆談ノートを配置した。また,外から見える位置に,筆談マークを表示した。

## その他事項

## 実施内容

③筆談ボードを配備するとともに,ひろば出入口付近に筆談マークを表示した。









建領	<b>於物特定事業</b>														
Š	整備対象	国分寺南町診療	<b>奈所</b>			対象	事業	者名	医绷	療法人	(社団	福	仁会		
事業	<b>美内容・実施時</b>	期													
番号	事業	<b>美内容</b>	延長(m) 箇所数	目標時期				短期		実施	時期		長期		
			- Linax	- 5745		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1		入口までの経路	1か所	継続	実施時期	[				※継続	検討中				
_	の段差解消		273771	検討	備考 進捗状況						期につい 補完す <sup>2</sup>		引き続	き検討	する。
					実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2		記慮した道路か	1 か所	継続 検討	大心时知	[		·		r	<b>検討中</b>				
	り気付までの影	秀導案内の設置		化直头	備考 進捗状況						期につい補完する		引き続	き検討	する。
						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3		こ対応したカウ	1か所	継続	実施時期	[				※継続	検討中		<del></del>		
•	ンターの設置		273771	検討	備考 進捗状況						期につ!補完す		引き続	き検討	する。
	<b></b>				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	筆談ツールの準  の設置	準備とその表示	1 か所	短期		1.45									
	の成臣				備考 進捗状況	・人的	対応して	いる							
		ストメイト用設		継続	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9 改装見	<b>R10</b>	R11	R12	R13
5	備の設置	ヘトンコト用政	1 か所	検討	備考			修を伴	うこと	から時	期につ	いては		 き検討	 する。
					進捗状況						補完する		544	D42	242
	トイレへのべも	ビーチェアの設		継続	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8 ※核	R9 討中	R10	R11	R12	R13
6	置		1か所	検討	備考 進捗状況					から時	期につい 補完す		<u></u> 引き続	 き検討	する。
					実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
7		ニーベッドの設	1 か所	継続 検討	大心时知						討中		·		
	置			1201	備考 進捗状況						期につ		引き続	き検討	する。
					実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
8	階段上端部への	の点状ブロック	1 か所	継続 検討	ı.						討中		r		
	の設置			روکل	備考 進捗状況	・整備	までの	間は人	的対心	により	補完する	රං 			
そ					実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の他					備考 進捗状況					l	<u> </u>				
実施	に必要な資金	額及び調達方法	<b>.</b>												
宝龙	 														
	MA PRICE														
₹σ.	)他事項														



#### 

## 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
留与	サ末 門台	箇所数	時期				短期					長期		
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				実施時期				·	※検	討中				
											、誘導			
1	視覚障害者に配慮した誘導	2~4	継続								今後検			
1	案内の設置	か所	検討	備考							床は、・			
				進捗状況		でめる なりま		得用ノ	ロック	寺を設	置する	場合は	別逐協	譲かめ
								節囲と	かり床	仕上が	丸井様	財産で	あろ為	別途
						エファ が必要			.G 7/1	111/3	7.07 1.19()	(1) <del>L</del> (1)	יפווים כט	. المحادد الم
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	階段上端部への点状ブロッ	2 +/==	継続	実施時期			·	·	※検	討中	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
2	クの設置	2か所	検討	備考	・大規	模改修	工事な	どに合	わせ設	置検討	する。	ı		ı
				進捗状況										
				ch14-n+++0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
٥				備考										
				進捗状況										
そ				中华吐姆	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
<del>て</del>				実施時期										
他				備考				•			•			
10				進捗状況										


## 実施に必要な資金額及び調達方法

## 実施済項目


- ・バリアフリートイレ、8Fオストメイト、介助用ベットの設置
- ・ベビーシート、ベビーチェア、授乳室の設置
- ・貸出用ベビーカーの設置
- ・子供用トイレの設置
- ・社員のサービス介助士取得
- ・手話でのあいさつを社員が勉強

## その他事項

・視覚障害者誘導用ブロックの設置は周辺施設・設備所有者との調整を行いながら進める

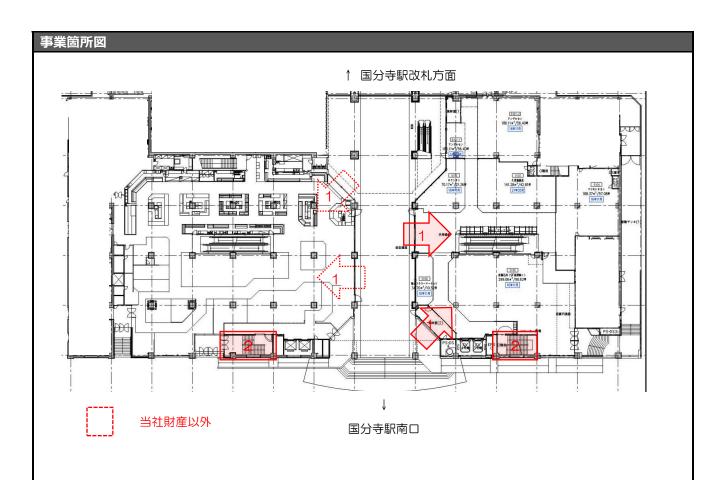

①視覚障害者誘導用ブロックの設置位置の例

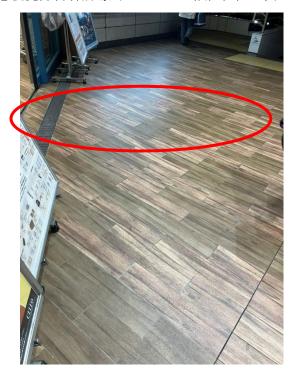

②点状ブロック設置の設置位置の例



# 建築物特定事業 整備対象 西友国分寺店 対象事業者名 合同会社西友 事業內容·実施時期

	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
番号	争耒州谷	箇所数	時期				短期					長期		
	  視覚障害者に配慮した道路			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	からサービスカウンターま	未定	継続	大心时知	[		·	,	※検	討中				
	での誘導案内の設置	المحادث	検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	車いす使用者に対応した力	未定	継続	<b>夫</b> 爬吋期	[	,	,		※検	討中		·		
	ウンターの設置	/\L	検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
				⇔++-n±+00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	筆談ツールの準備とその表	1箇所	短期	実施時期										
	示の設置	1 回//	247741	備考 進捗状況	• R6 £	度ます	でに準値	前しス?	タート	予定				
				ch14-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
4	階段上端部への点状ブロッ	未定	継続	実施時期		· <del></del>	<del>,</del>	<del></del>	※検	討中	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
	クの設置	<b>*</b> E	検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
5	車いす使用者用トイレの設	未定	継続	大心时和				,	※検	討中				
	置		検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
6	トイレへのオストメイト用	未定	継続	<b>夫</b> 爬时期					※検	討中				
	設備の設置	<b>*</b>	検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
				\$44-n±40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
7	トイレへのベビーベッドの	未定	継続	実施時期			·	·	※検	討中				
	設置	<b>不</b> 足	検討	備考 進捗状況	・社内	本部や	関係者	と調整	し、実	施時期	を調整	してい	<.	
その				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の他				備考 進捗状況		I	ı	I	1	ı	ı	I	I	

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。

## 実施済項目

- ・主要な出入り口や店内通路の幅は確保されている。
- ・施設全体を案内する案内板設置済み

## その他事項

## 事業箇所図

③サービスカウンターにホワイトボードを常時用意予定



みずほ銀行国分寺支店 整備対象

対象事業者名 株式会社みずほ銀行

## 事業内容・実施時期

	(1) 11 / (1) 2/1/1/1													
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田つ	チボバロ	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	階段上端部への点状ブロッ	2か所	短期	天心时期										
	クの設置	273771	, 11, 13	備考	・設置	済み								
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				夫爬吋期										
_				備考										
				進捗状況										
				中作吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
				備考										
				進捗状況										
Z				中作吐物	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考			•	•			•	•	•	
16				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法


・事業実施に必要な経費は社内経費で完了

## 実施済項目

- ・支店入店口にスロープの設置 ・営業フロアへのエレベータ設置
- ・支店入口から営業フロアへの階段に点状ブロック設置

## その他事項

## 事業箇所図

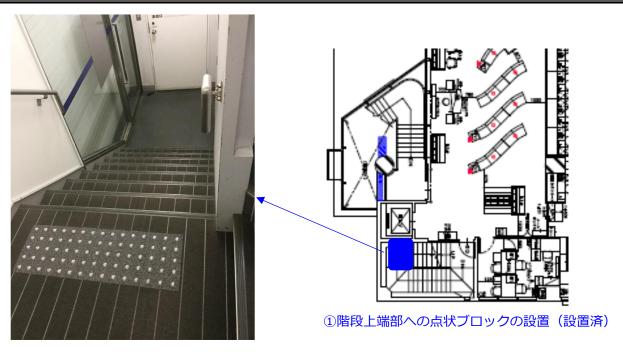

整備対象 多摩信用金庫 国分寺支店 対象事業者名 多摩信用金庫

## 事業内容・実施時期

<b>-</b>														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田つ	チ未り口	箇所数	時期				短期					長期		
	視覚障害者に配慮した道路			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	から受付案内までの誘導案	1 1か所	継続	天心时期			,	,	※検	討中				,
	内の実施	173771	検討	備考 進捗状況										
				C345-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				<b>夫</b> 爬吋期										
J				備考 進捗状況										
7				c>++-n±+0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考				•	•			•	•	
16				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

## 実施済項目

## その他事項

出入口から受付(ロビーフロア)のフロアにロビー担当者を配置しています。A T Mの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

## 事業箇所図

## ①視覚障害者に配慮した誘導案内の設置予定箇所



整備対象 多摩信用金庫 国分寺南口支店 対象事業者名 多摩信用金庫

## 事業内容・実施時期

T'A														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田つ	チ末バロ	箇所数	時期				短期					長期		
	   視覚障害者に配慮した道路			⇔₩n±#0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	から受付までの誘導案内の	未定	継続	実施時期				r	※検	討中			,	
	設置	<b>不足</b>	検討	備考 進捗状況	・検討	中								
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				<b>天</b> 爬时期										
				備考 進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
っ の				天心时期	•									
他				備考										
				進捗状況										


## 実施に必要な資金額及び調達方法

## 実施済項目

## その他事項

出入口から受付(ロビーフロア)のフロアにロビー担当者を配置しています。A T Mの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

# 事業箇所図

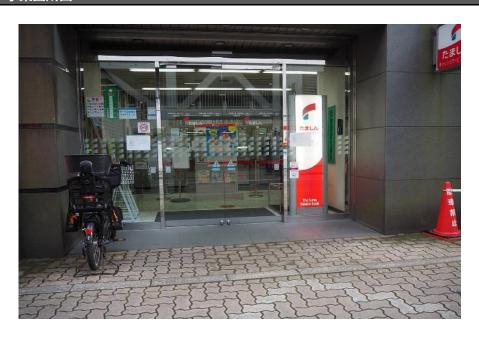

整備対象

国分寺本町郵便局

対象事業者名 日本郵便株式会社

## 事業内容・実施時期

T'A														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	<b>5</b> 3111 5 <u>—</u>	箇所数	時期				短期					長期		
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から出入口までの経路	1か所	継続	<b>夫</b> 厄吋期	[			,	※検	討中				
_	の段差解消	173771	検討	備考 進捗状況	・関係	各所と	早期実	現に向	けて鋭	意調整	中			
				ch14-0+440	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	筆談ツールの準備とその表	2台	短期	実施時期										
	示の設置		7:12/43	備考	・令和	4年4	月、準	<b>- 備完了</b>	•					
				進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				大心时和										
				備考 進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
o O				大心时别										
他				備考										
ن				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

## 実施済項目

・自動ドアの設置。点字ブロックの設置。窓口ローカウンター設置。段差解消の為、簡易スロープ設置。

## その他事項

## 事業箇所図

## ②筆談表示(設置済)



窓口ローカウンター設置



#### 建築物特定事業 国分寺南郵便局 対象事業者名 日本郵便株式会社 整備対象 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 時期 番号 事業内容 短期 長期 R11 R4 R5 R7 R10 R12 R13 視覚障害者に配慮した道路 実施時期 継続 から受付までの誘導案内の 1 か所 1 検討 備考 設置 進捗状況 R11 R12 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R13 実施時期 継続 出入口の有効幅の確保 検討 1 か所 備考 進捗状況 R11 R6 R8 R10 R12 R13 実施時期 車いすの使用者に対応した 継続 3 1 か所 検討 カウンターの設置 備考 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 筆談ツールの準備とその表 4 短期 1 か所 示の設置 備考 実施済 進捗状況 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R5 R6 実施時期 階段上端部への点状ブロッ 継続 5 1 か所 検討 クの設置 備考 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 の 備考 進捗状況 実施に必要な資金額及び調達方法 ・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。 実施済項目 ・筆談ツールの準備と表示の設置。 その他事項

## 事業箇所図

## ②出入口の有効幅の確保




## ④筆談ツールの準備とその表示 の設置(設置済)



## ⑤階段上端部への点状ブロック の設置



#### 建築物特定事業 株式会社JR中央線コミュニティデザイン 整備対象 JR東日本ホテルメッツ国分寺 対象事業者名 日本ホテル株式会社 事業内容・実施時期 実施時期 延長(m) 箇所数 目標 番号 事業内容 短期 長期 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 視覚障害者に配慮した道路 実施時期 継続 ※検討中 から受付までの誘導案内の 未定 検討 ※権利者等と調整し、検討する。 設置 進捗状況 R10 R11 R12 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R13 実施時期 階段上端部への点状ブロッ ※検討中 継続 2 未定 検討 クの設置 ※権利者等と調整し、検討する。 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 車いす使用者に対応した力 ※検討中 継続 3 1 検討 ウンターの設置 ※改修のタイミングに合わせて、検討する。 備考 進捗状況 R10 R11 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R12 R13 実施時期 短期 筆談対応を示す表示の設置 1 ・案内表示を掲示。iPad 筆談アプリで対応。 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 ※検討中 車いす使用者用トイレの設 継続 5 1 検討 置 備考 ※改修のタイミングに合わせて、検討する。 進捗状況 R6 R9 R10 R11 実施時期 トイレへのオストメイト用 ※検討中 継続 6 1 検討 設備の設置 ※改修のタイミングに合わせて、検討する。 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 ※検討中 トイレへのベビーチェアの 継続 7 1 ※改修のタイミングに合わせて、検討する。 検討 設置 備考 進捗状況 R10 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R11 R12 R13 実施時期 トイレへのベビーベッドの 継続 ※検討中 8 1 検討 設置 備考 ※改修のタイミングに合わせて、検討する。 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 の 他 進捗状況 実施に必要な資金額及び調達方法 ・事業実施時に検討する。 実施済項目 ・筆談対応を示す表示の設置 その他事項

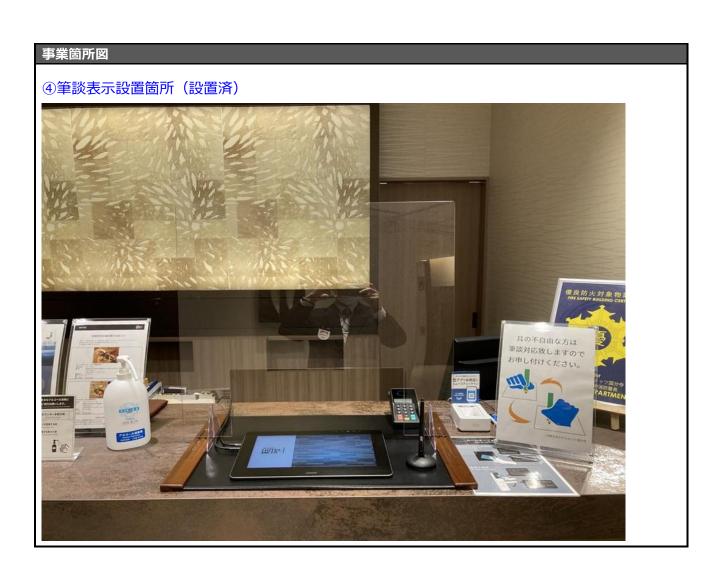

## 交通安全特定事業

事業対象 生活関連経路

## 対象事業者名 東京都公安委員会

## 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
留写	尹未竹谷	箇所数	時期				短期					長期		
				C-16-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
İ	バリアフリー対応型信号機(音		短期	実施時期										
1	響式、経過時間表示付き等)の	未定	長期	備考		実施予	定(整	備済箇	所有。	実施済	項目欄	及び実	施内容	欄参
	整備			進捗状況	照)									
1					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			短期	実施時期	K4	KJ	KU	K/	KO	K9	KIU	KII	KIZ	KIS
2	エスコートゾーンの整備	未定	長期	備考	・順次	実施予	定							
			区州	進捗状況	75677		~_							
			<i>k</i> =#0	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3	道路標識及び道路標示の高輝度	未定	短期	<b>夫</b> 爬时期										
	化		長期	備考	・適切	な補修	等を継	続的に	実施(	高輝度	化は実	施済)		
<u> </u>				進捗状況										
			短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
14	  違法駐車車両の指導取締り等	_	• \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7420. 5743										
			長期	備考	・継続	的に実	施							
<b>├</b>				進捗状況					i				ì	1
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
そ	   「交通安全特定事業計画国分寺											L		
の	「又通女王苻足事業計画国力守	_	短期	/*** ***							間」や			
他	INDIANCE CONTRACTOR			備考 進捗状況	に除し した	凹心息 9	ハさ里	安争坦	」寺,	より許	細な特	<b>止争</b> 業	言画を	來正
				~_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,									

## 実施済項目

- ・別紙1-③(南町二丁目交差点)のバリアフリー対応型信号機について、実施済箇所有。
- ・別紙1バリアフリー対応型信号機の設置予定箇所図の3箇所について、バリアフリー対応型信号機の設置 済。







## その他事項


## 実施内容、写真、参考資料等


※実施内容は別紙に示す


## 別紙

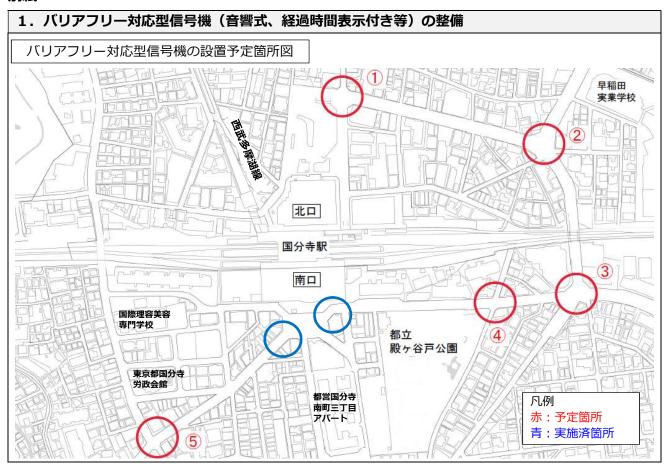


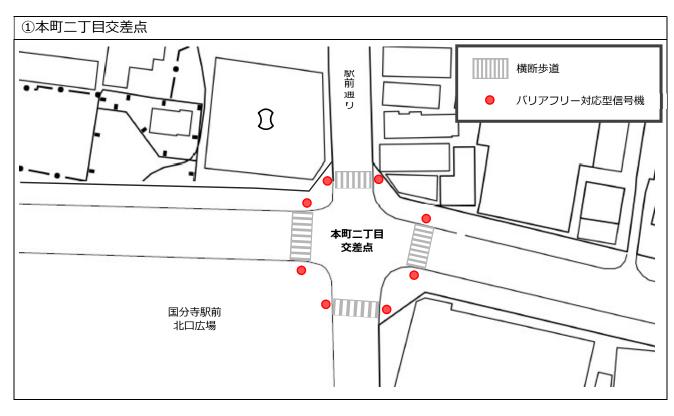


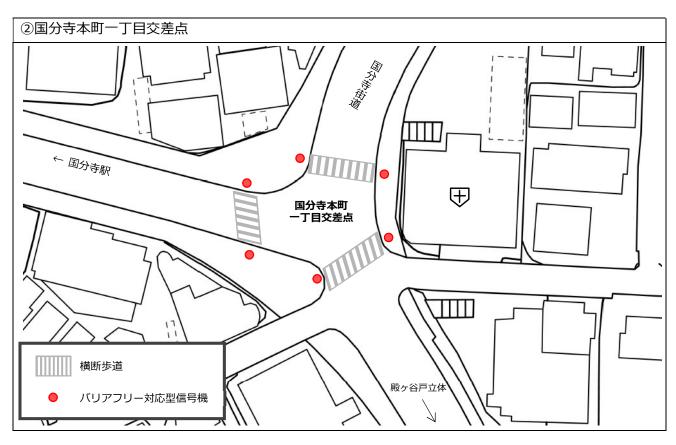

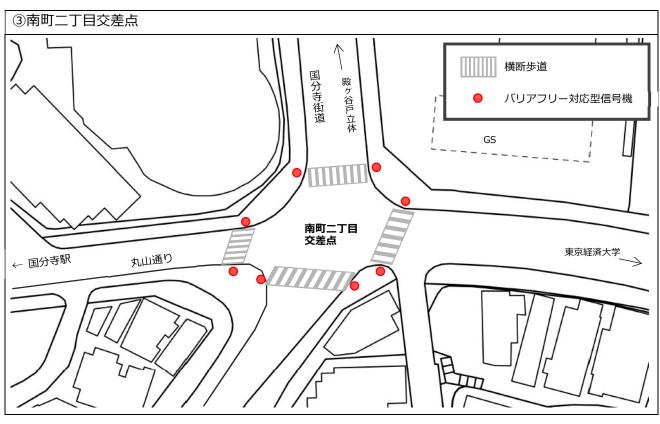

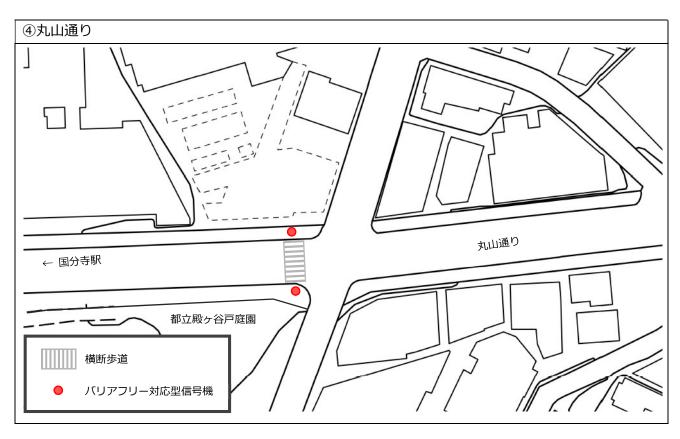

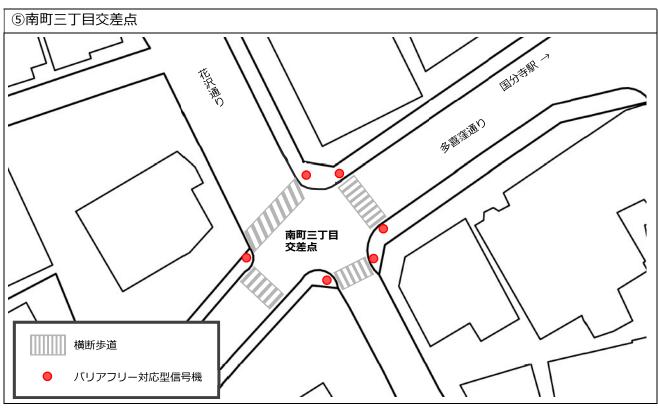

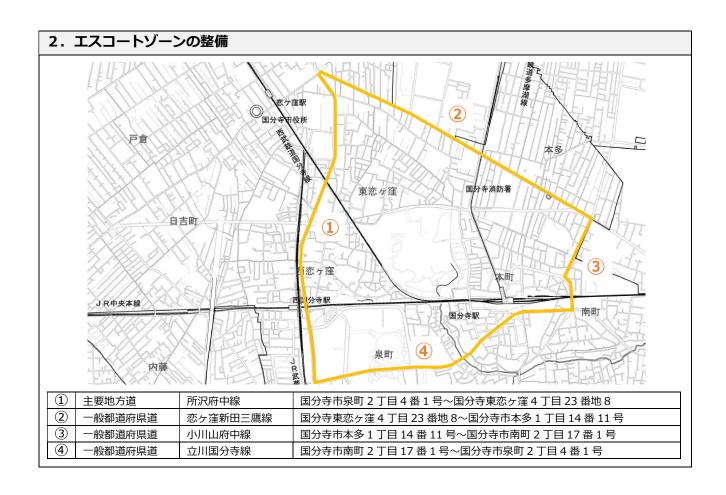

事業対象 市立小・中学校の児童・生徒 対象事業者名 国分寺市・国分寺市教育委員会

## 事業内容・実施時期

3 1	Kr) 中,大师内知												
番号	事業内容	目標						実施	時期				
田勺	争未りせ	時期				短期					長期		
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害のある人々などとの交流や	短期	実施時期										
1	対話の機会の設定	長期	備考	継続的	に実施								
		12,743	進捗状況										
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2			実施時期										
-			備考		ı	ı			ı				ı
			c>++-n±+00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3			<b>美</b> 胞 时期										
3			備考		ı	ı			ı				ı
			進捗状況										
7			c>++-n±+00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その			実施時期										
他			備考										
16			進捗状況										

## 実施済項目

・各市立小・中学校が年間指導計画に基づき実施

## その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等

・市立小・中学校においては、各学校の年間指導計画に基づき、以下に示す「車いす体験」のような活動を通して、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導を計画的に行っている。





#### 教育啓発特定事業 対象事業者名 国分寺市 事業対象 市職員 事業内容・実施時期 実施時期 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R10 R5 R6 R7 R8 R9 R11 R12 R13 実施時期 短期 1 接遇等の職員研修の実施 備老 継続的に実施 長期 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 短期 心のバリアフリーに関する学習会の実施 備考 継続的に実施 長期 進捗状況 R4 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 3 備考 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 ത 備考 他 進捗状況

## 実施済項目

- ・公務員として市民と接する際の心構えを習得するため、新任研修「接遇研修」を年1回実施。
- ・心のバリアフリーに関する学習会に関する学習会を年一回実施

#### その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等

- 「接遇研修」の主な内容(バリアフリーに関する内容)
  - ・国分寺市職員の障害を理由とする差別解消推進対応要綱について
  - ・東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について
  - ・障害種別ごとの主な特徴について
  - ・障害者差別解消法による「合理的配慮」について
- 2. 心のバリアフリーに関する学習会

(開催日:令和6年2月 講師:まちづくり計画課・障害福祉課職員 参加人数16人)

- ・年一回実施
- ・様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支えあう心のバリアフリーに関する内容の学習会を実施した。受講者からは、「施設整備だけでなく、ソフト面での配慮が求められていることがよく分かった。」、「障害のある人の特徴と支援も具体的にイメージすることができた」等の意見があった。



#### 教育啓発特定事業 事業対象 市民 対象事業者名 国分寺市 事業内容・実施時期 実施時期 目標時期 番号 事業内容 短期 長期 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 短期 ヘルプマーク等の配布 備老 継続的に実施 長期 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 短期 理解促進啓発活動の実施 備老 継続的に実施 長期 進捗状況 R4 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 3 備考 進捗状況 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 ത 備考 他 進捗状況

## 実施済項目

- ・ヘルプマーク・ヘルプカード及び災害時等障害者支援バンダナの配布、普及啓発グッズの作成・配布(継続して実施)
- ・障害者週間(毎年12月3日~9日)に合わせた障害者週間行事の実施(継続して実施)
- ・障害者差別解消法理解促進のための研修会・講演会の実施(H28~29)
- ・障害理解促進のための映画上映会の実施(H30~31)

#### その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等

#### ① ヘルプマーク等の配布(継続して実施)

- ・高齢者、障害者等、支援が必要な方のためのマーク等(ヘルプ カード、ヘルプマーク及び災害時等障害者支援バンダナ)を配布
- ・市民に対し、マーク等への理解を促進するための啓発活動を実施

#### ② 理解促進啓発活動の実施(継続して実施)

・毎年、障害者週間(12月3日~9日)に合わせて障害者週間行事を企画し、広く市民に向けて、障害理解促進に向けた講演会、展示会、体験型ワークショップ等を実施

## 【R5年の実施概要】

- ① ヘルプマーク、ヘルプカード普及啓発グッズとしてボールペン を作成し、市内小学校や庁内窓口にて配布した
- ② 障害者週間行事として、「ミニ手話講座」を実施、市内障害者施設によるワークショップ及び物品販売会、障害のある方々による絵画等作品展示会を実施した





令和5年度障害者週間行事 ミニ手話講座を実施

③ まちづくり計画課主催の心のバリアフリーに関する学習会に講師として参加し、「障害のある人の特徴と支援のポイント」、「障害者差別解消法の改正」について庁内向けに講習を実施した

事業対象 JR 国分寺駅 対象事業者名 JR 東日本

#### 事業内容・実施時期

77													
番号	事業内容	目標						実施	時期				
田勺	デ木「コロ	時期				短期					長期		
	高齢者・障害者等に対する適切な接遇・	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	解除の方法に関する駅係員への継続的な	· 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Z/18+17/1										
1	教育訓練の実施	長期	備考 進捗状況	・継続	的に実	施する	۰						
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2			実施時期										
_			備考 進捗状況	•									
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3			実施時期										
			備考 進捗状況	•									
そ			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の			大心时别										
他			備考	•									
160			進捗状況										

## 実施済項目

- ・実車を使用した救出訓練等の社員教育を継続して実施
- ・「声かけ・サポート」運動を継続して実施

## その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等

- ① 社員教育の実施(継続して実施)
- ●駅間長時間停車中の車内に、白杖・車いすお客さま・高齢者・障害者がいる想定での実車を使用 した救出訓練を実施した。(2023年7月3日~6日 2024年6月17日~20日 三鷹車両セン







- ●当社・他社問わず、鉄道業において発生した情報は発生の都度、朝礼・駅報にて社員周知するとともに、社員教育として「他山の石」の活用を行っている。
- ② 「声かけ・サポート」運動の実施(継続して実施)
- ●ポスターの掲出・駅構内放送の実施を行うとともに、社員からお客さまに対して、お客さまと双方向でコミュニケーションをとりながら、鉄道サービス業として適切な声かけを実施した。

#### 教育啓発特定事業 事業対象 対象事業者名 西武鉄道株式会社 西武国分寺駅 事業内容・実施時期 実施時期 番号 事業内容 時期 短期 長期 R4 R5 R6 R10 R11 R12 R13 高齢者、障害者等に対する適切な接遇・ 実施時期 短期 介助の方法に関する駅係員への継続的な 長期 教育訓練の実施 進捗状況 R4 R6 R10 R11 R13 実施時期 2 進捗状況 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 実施時期 3 進捗状況 R4 R6 R8 R9 R10 R11 R12 R13 そ 実施時期 $\sigma$ 備考 進捗状況

## 実施済項目

- ・机上及び実技による社員教育を継続して実施
- ・「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンを継続して実施

#### その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等

① 社員教育の実施(継続して実施)

お客さまにより安心感をもって西武鉄道をご利用いただくため、机上及び実技による社内教育を実施 し対応スキル向上に努めている。

② 「声かけ・サポート」運動強化キャンペーン(継続して実施)

お客さまが安全かつ安心して施設をご利用いただけるよう、お困りのお客さまに対して駅係員から積極的にお声かけを行うとともに、周囲のお客さまからもお声かけにご協力いただく。

(交通事業者83社局、障害者団体を含む8団体で実施。2023年8月23日 ニュースリリース)

事業対象 路線バス(西武) 対象事業者名 西武バス株式会社

## 事業内容・実施時期

#5	声类内穴	目標						実施	時期				
番号	事業内容	時期				短期					長期		
	高齢者,障害者等に対する適切な接遇・	<i>k</i> =++⊓	⇔₩n±₩0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	向師句, 障害句等に対する過切な接週・   介助の方法に関する乗務員への継続的な	短期	実施時期										
1	教育訓練の実施	長期	備考 進捗状況										
			C215-04-00	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2		実施時期 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――											
			備考 進捗状況			•				•			
			⇔45-n±40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3			実施時期										
5			備考 進捗状況										
7			⇔44-n±+0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その			実施時期										
他			備考 進捗状況										

## 実施済項目

・全乗務員に対して各営業所で3ヶ月に1回開催している定期研修のうち、年1回は車いすを使用した実地研修を実施。

## その他事項

・全般的な接遇教育として最低年6回、覆面添乗員が営業車両に乗り込み接遇状況を確認、接遇が不適切な者については各営業所管理者から指導を実施。その他定期的に研修所での集合教育等を実施。

#### 実施内容、写真、参考資料等



事業対象 路線バス(立川) 対象事業者名 立川バス株式会社

## 事業内容・実施時期

7/													
番号	事業内容	目標						実施	時期				
ш-7	テスパリロ	時期				短期					長期		
	  高齢者, 障害者等に対する適切な接	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	遇・介助の方法に関する乗務員への	•											
	継続的な教育訓練の実施	長期	備考 進捗状況										
			C345-0+40	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2			実施時期										
			備考 進捗状況						•				
			中作吐烟	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3			実施時期										
J			備考 進捗状況										
そ			⇔44-n±+0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
の			実施時期										
他			備考			•	•	•	•	•	•	•	
16			進捗状況										

## 実施済項目

・奇数月には全乗務員対象に小集団教育を実施

## その他事項

## 実施内容、写真、参考資料等



事業対象 路線バス(京王) 対象事業者名 京王電鉄バス株式会社

#### 事業内容・実施時期

于オ	(P) <del>在"大</del> ル时知												
番号	事業内容	目標						実施	時期				
田勺	争未r 1 <del>日</del>	時期				短期					長期		
	   高齢者, 障害者等に対する適切な接遇・	<i>t</i> =#0	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	介助の方法に関する乗務員への継続的な	短期	天爬时期										
1	教育訓練の実施	長期	備考 進捗状況										
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2			実施時期										
_	2		備考 進捗状況										
			中作品	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
そ			######################################	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ての			実施時期										
他			備考			-	•		-		•	•	
, .			進捗状況										

## 実施済項目

・全乗務員に対して3年に1度の頻度で受講させている定期研修(開催は毎年)において、本物の車いすを用いた介助訓練、手足におもりやギブス等で関節を固定してバスに乗り降りする高齢者疑似体験を実施。

#### その他事項

・全般的な接遇教育として全乗務員に対して年 2 回以上、覆面添乗員が営業車両に乗車してチェックを行い、各営業所の管理者から指導を実施。また必要に応じて集合教育形式の CS 研修も実施。

#### 宝施内容。 写直。 参老資料等



## その他の特定事業

対象事業者名 国分寺市 整備対象 国分寺駅北口駅前広場

## 事業内容・実施時期

77														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田勺	尹未r 1日	箇所数	時期				短期					長期		
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	北口階段中央部への手すり	1 箇所	短期	実施時期										
1	の設置	工间刀	<i>γ</i> 1777/1	備考	・実施	済		•						
				進捗状況										
				<b>⇔</b> ₩-n±₩0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2	北口階段踊り場への点状ブ	1 箇所	短期	実施時期										
_	ロックの設置	工间//1	<i>γ</i> π <i>24</i> )]	備考	・実施	済	•			•				
				進捗状況										
				######################################	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
٦				備考			•	•		•				
				進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
ての	方向定位ブロックの設置	14 箇所	短期											
他		(54基)	Λ11 <del>74</del> ]	備考	・実施	済(R	事後村	<b>食証完</b>	7)	•	•			
16				進捗状況										

## 実施済項目

全て実施済み。

## その他事項

事業箇所図

# ②点状ブロック ①手すり 国分寺駅北口駅前 広場方面 ②点状ブロック 新設手すり(階段上) (a)

(実施済)




新設点字ブロック (**b**)

0

cocobunji WEST 方面

①手すり(実施済)

## 方向定位ブロック設置位置

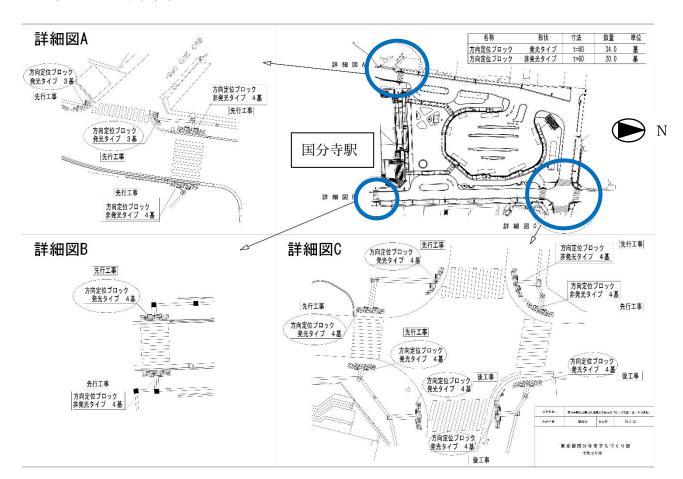



# その他の特定事業

整備対象 南口広場 対象事業者名 権利者等と調整の上,決定。

## 事業内容・実施時期


3 1														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
田つ	チ末には	箇所数	時期				短期					長期		
				⇔₩n±#0	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			継続	実施時期	[	,		,	※検	討中				
1	南口広場の整備	1箇所	検討	備考	• [R4]	基礎	周査委	託でバ	リアフ!	ノー状	兄を確認	忍。維持	寺管理の	の一部
				進捗状況	移管	等につ	いて,	土地所	有者と	協定締	結。			
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
١				実施時期										
2				備考		l		ı	ı			ı	ı	
				進捗状況										
				宇佐味期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
				備考										
				進捗状況										
そ				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
っ				大心时期										
他				備考										
تار				進捗状況										

## 実施済項目

## その他事項

・土地所有者との協議,市民意向の把握等を経て具体的な整備内容を決定していく。

## 事業箇所図

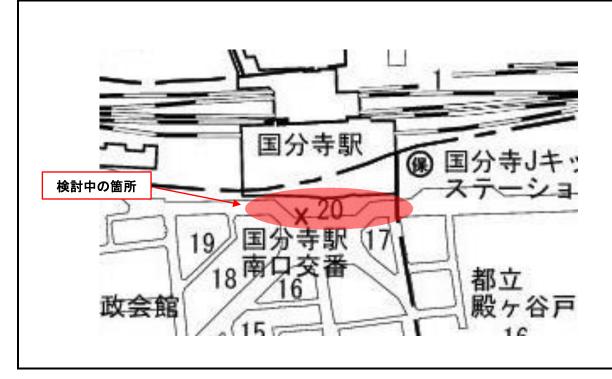

## その他の事業

整備対象 泉町二丁目バス停 対象事業者名 京王電鉄バス株式会社

## 事業内容・実施時期

<b>7</b>														
番号	事業内容	延長(m)	目標						実施	時期				
	<b>5</b> 210. <b>5</b> 22	箇所数	時期				短期					長期		
				字标吐彻	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	バス停留所への上屋の設置	2 か所	継続	実施時期					※検	討中				
_		2/3//1	検討	備考	・収支	状況も	勘案し	ながら	検討す	る				
				進捗状況										
				\$#c###	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2				実施時期										
_				備考		•	•	•		•		•		
				進捗状況										
				\$\\mu\mathre	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
3				実施時期										
5				備考		•	•	•		•		•		
				進捗状況										
7				<b>⇔₩</b> п±₩п	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
その				実施時期										
他				備考			1	1		1	1			
16				進捗状況										

## 実施に必要な資金額及び調達方法

・基礎を深く埋める必要があるため、埋設物の状況によって設置費用は大きく変化する。

## 実施済項目

## その他事項

・上屋設置後も十分な歩行空間が確保されていることを確認する必要がある。

# 

## 国分寺市バリアフリー特定事業の進捗状況 (令和5年度実績)

## 令和7年1月

発 行:国分寺市

編集:まちづくり部まちづくり計画課

〒185-8501

東京都国分寺市泉町2丁目2番18

電話 042-325-0111 (代表)
